



## FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNION EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

### INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

#### INFORME CIERRE DE PROYECTOS RESUMEN

Elaborado por	Liderado por (nombre país, institución y persona)	Contribución de informe por Socio/país 1 de la triangulación	Contribución de informe por Socio/país 2 de la triangulación	Contribución de informe por otros socios
Ricardo Salazar Díaz	País: Costa Rica Institución: ITCR Persona (as): Ricardo Salazar Díaz, Laura Brenes Peralta, Marcela Fernández Rodríguez, Carlos Robles Rojas, Ligia Guerrero Vargas.	País: Honduras Institución: FENAPROCAHAO Persona (as): Anibal Ayala Ayala Sindy Mejía, Alondra Sánchez	País: Nicaragua Institución: Asociación Madre Cacao Persona (as): Mario Nolasco, Silvia Aguilera	País: Italia Institución: UNIBO Persona (as): Matteo Vituari, Anna Niero, Simone Próspero

#### Anotación:

- Yo consigno que la información aquí proveída es veraz
- Como persona coordinadora del proyecto cuento con el soporte debido de los procesos y productos
- Soy consciente que el Fondo de Cooperación Triangular UE-C-LAC podrá contactarme para el proceso de evaluación, o materia relacionada con el accionar del proyecto que coordiné.

Nombre del proyecto	Bio-circular: cadenas de valor basadas en bioeconomía circular, oportunidades para el cacao en Centroamérica.
Nombre y apellidos de persona coordinadora del proyecto	Ricardo Salazar Díaz
Firma de la coordinación del proyecto	

**Descarga:** La información podrá ser empleada por el fondo para todos los efectos de su publicación y reportes, si hubiese alguna objeción de un producto en particular indicarlo.



## FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNION EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

### INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

#### Tabla de contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL.....	3
<b>Título del proyecto y código SIAP</b> .....	3
Presupuesto aprobado .....	3
1.2. Situación general AL CIERRE:.....	3
Realice una sinopsis de las actividades que considera .....	3
<b>1.3 Alcance: LOS LOGROS</b> .....	4
<b>ALCANCE ORIGINAL</b> .....	4
1.3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	5
<b>1.4 Transversalización de enfoques</b> .....	6
2 Gestión del conocimiento y comunicación .....	8
2.1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO .....	8
3. CONTRAPARTIDA.....	16
<b>CONTRAPARTIDA INSTITUCIÓN LIDER (TEC)</b> .....	16
<b>CONTRAPARTIDA INSTITUCIÓN SOCIA 1 (FENAPROCACAHO)</b> .....	17
<b>CONTRAPARTIDA INSTITUCIÓN SOCIA 2 (Madre Cacao)</b> .....	18
<b>CONTRAPARTIDA INSTITUCIÓN SOCIA 3 (UNIBO)</b> .....	18
4. ANEXOS.....	19



## FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNION EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2


### INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

1. INFORMACIÓN GENERAL			
<b>Título del proyecto y código SIAP</b>	9063-02 Biocircular cacao		
<b>Presupuesto aprobado</b>	69.000 euros	<b>Periodo de ejecución de esta convocatoria</b>	marzo 2024- abril 2025
<b>1.2. Situación general AL CIERRE: Realice una sinopsis de las actividades que considera</b>	<p>Podemos resumir los logros del proyecto en base a los dos objetivos planteados. El primero fue implementar un plan de capacitación en bioeconomía, y consideramos que la capacitación se brindó con éxito de manera simultánea a más de 60 personas en Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Se elaboró material didáctico de cuatro módulos para la capacitación, material de uso libre que se está sistematizando para que pueda ser implementado en futuras capacitaciones que sean requeridas en esta temática. El segundo objetivo, consistió en un plan de acción para nueve empresas, tres por país, para que puedan incorporar el enfoque de bioeconomía en sus modelos de negocios. Se realizó un informe para cada empresa, de tal manera que puedan seguir las recomendaciones para la implementación de prácticas sostenibles y el fortalecimiento de las ya existentes en los diferentes procesos que cada una de ellas realiza.</p> <p>Al inicio del proyecto sabíamos que existían diferencias en las cadenas de valor de cacao de cada uno de los países, y durante la ejecución del proyecto, pudimos identificar esas diferencias. Con Biocircular cacao tuvimos la oportunidad de primera mano de conocer junto con nuestros socios las diferencias entre los niveles de organización de los productores, así como el rol de los diferentes actores dentro de las agrocadenas. Además, la participación del socio de Italia fue muy valiosa, pues a pesar de que ellos no son productores de cacao, si tienen mucha experiencia en otras agrocadenas y el aporte técnico en temas de economía circular ha sido muy valiosa técnicamente.</p>		



## FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNION EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

### INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

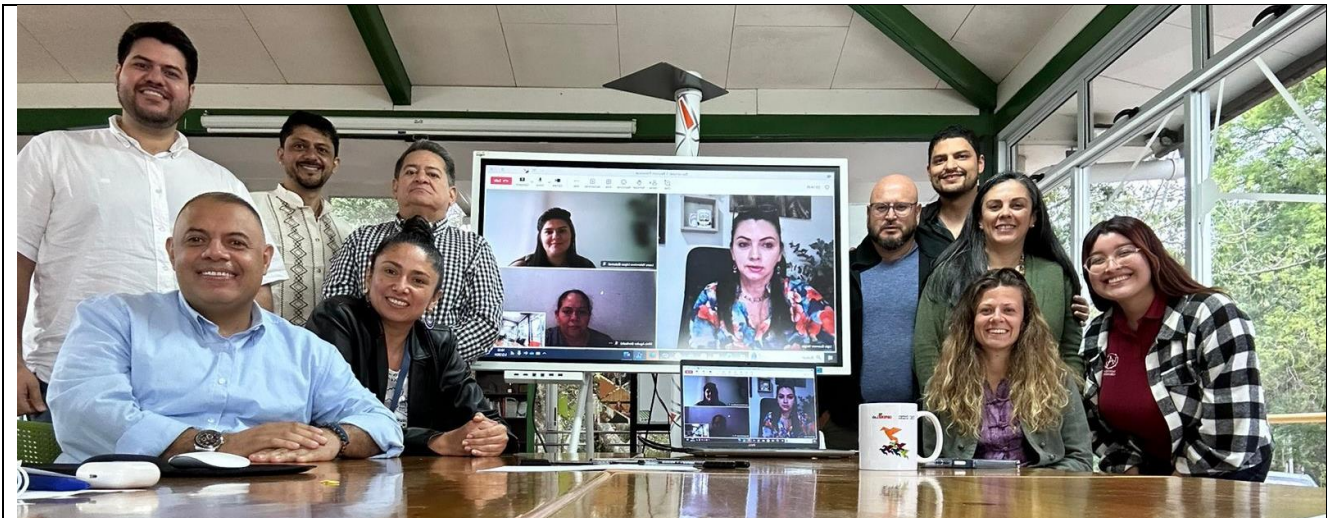

#### 1.3 Alcance: LOS LOGROS

ALCANCE ORIGINAL	Alcance logrado al cierre del proyecto	Alcance (superado según proyecto original)
<p>Para el desarrollo de capacidades empresariales en cadenas de valor, modelos productivos sostenibles y bioeconomía, se realizará un plan de capacitación por medio de sesiones grupales (presenciales y virtuales), con al menos 2 horas por semana. Se espera que se incluya el desarrollo de contenido asincrónico y otros materiales didácticos que fortalezcan los procesos de aprendizaje de los actores institucionales que luego podrán co-construir y aportar a los modelos productivos. De esta manera, podrá lograrse una real vinculación de la academia como agente tractor de la bioeconomía y la economía circular en la región centroamericana, particularmente para esta propuesta en actividades de la cadena de valor del cacao.</p>	<p>El plan de capacitación se brindó con éxito de manera simultánea a más de 60 personas en Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Además de las nueve empresas que se asesoraron a partir de un enfoque de Bioeconomía, que no se incluyó en el alcance original, pero si estaba dentro de los objetivos</p>	<p>Se elaboró material didáctico (videos y manuales) de cuatro módulos para la capacitación, material que se está sistematizando para que pueda ser implementado y de uso libre (repositorio de la biblioteca del ITCR) para que sea utilizado en futuras capacitaciones que sean requeridas en esta temática. El material está siendo colgado en la web del TEC.</p>



GOBIERNO  
DE COSTA RICA



Adelante2  
COOPERACIÓN TRIANGULAR UE-ALC  
FACILIDAD COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA



## FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNION EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

### INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

#### 1.3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se detalla en el Excel

## FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNIÓN EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

### INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

1.4 Transversalización de enfoques											
Se esperaría que todos los enfoques se cumplan, si por alguna razón alguno No Aplica (N/A) indicar la razón											
1.4.1 Derechos Humanos			1.4.2 Género			1.4.3. Diversidad Cultural			1.4.4. Sostenibilidad		
Detalle cómo sus actividades contribuyeron a los Derechos Humanos y cuáles en específico			Caracterice la calidad de la participación de género y el perfil (contratación, insumo, toma de decisiones, participación en actividades formativas, informativas u otras)			Integración múltiples grupos, incorporación de conocimientos, calidad de participación, entre otros			Sostenibilidad desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (indicar contribución a ODS principal)		
Lo planteado	Lo logrado	La evidencia	Lo planteado	Lo logrado	La evidencia	Lo planteado	Lo logrado	La evidencia	Lo planteado	Lo logrado	La evidencia
Procurar que los grupos vulnerables, como las mujeres, los pueblos indígenas y las minorías étnicas, estén representados y participen activamente en todas las etapas del proyecto. Esto puede incluir consultas comunitarias, grupos de trabajo y articulación con actores	Las personas beneficiarias del proyecto son de regiones muy rurales en los tres países, con la particularidad en Costa Rica y Nicaragua que son de zonas fronterizas. El proyecto atendió a personas en condiciones migratorias diversas que buscan	Los Chiles, Upala, Guatuso de Costa Rica. San Carlos, Los Guatusos de Nicaragua, comunidades fronterizas de donde participaron beneficiarios con estatus migratorios regular.	Durante todas las fases del proyecto se procurará un enfoque de género de manera transversal, desde la planificación, procesos de convocatoria, Términos de Referencia, metodologías en las capacitaciones, reportes e informes. De la misma forma se procurará diseñar	Además de que, según los indicadores de la cantidad de beneficiarios que evidencian que la mitad fueron mujeres y la otra mitad hombres. El proyecto identificó y seleccionó a grupos de mujeres emprendedoras como las empresas beneficiarias para implementar el modelo de	Cinco de los nueve informes presentados, corresponde a empresas lideradas por grupos de mujeres, con el fin de fortalecer su modelo de negocio con enfoque de biocircularidad.	Se debe reconocer y respetar la diversidad cultural de las comunidades involucradas, promoviendo que las prácticas agrícolas y comerciales respeten las tradiciones locales y promuevan la preservación de la cultura.	Participación en el proyecto de población indígena, en el caso de los Malekus en Costa Rica y de diferentes territorios con diferentes culturas de comunidades rurales en Costa Rica, Nicaragua y Honduras (incluida la ascendencia Lenca).	Los informes de las empresas beneficiarias evidencian como las prácticas de los modelos de negocios fomentan y respetan las prácticas de producción propias de las culturas (indígenas, rurales)	Con el fomento para la implementación de prácticas agrícolas sostenibles que tengan en cuenta la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. Articulación con organizaciones ambientales y expertos en sostenibilidad para orientar estas prácticas.	ODS 12: La bioeconomía circular permite un patrón productivo más sostenible y a futuro un involucramiento del consumidor que valore estos rasgos también.  ODS 4 : acceso a nuevos conocimientos en biocircularidad  ODS 8: La bioeconomía permite un mejor aprovechamiento de los recursos	Elaboración de productos académicos propios del proyecto, que se pueden observar y descargar desde la página web del proyecto.



**FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNION EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2**  
**INORME DE CIERRE DE PROYECTOS**

locales que trabajen con este eje en los territorios.	capacitarse y emprender.		algunos indicadores de género.	negocios con enfoque de biocircularidad .								
---	--------------------------	--	--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

## FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNIÓN EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

### INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

## 2 Gestión del conocimiento y comunicación

2.1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO						
Actividad	Naturaleza	Cantidad de personas beneficiadas directamente	Cantidad de personas beneficiadas indirectamente	Tipo de instrumento de soporte y comprobación a esta GESTIÓN DE CONOCIMIENTO	¿Se dará seguimiento? (sí, no)	Comente por qué se dará sí, no o parcialmente Y COMO
1.1.1.1. Identificación del perfil de los facilitadores que son propuestos a manera de contrapartida por las organizaciones colaboradoras en cada país y participantes al plan de capacitación según las características propias de las respectivas cadenas de valor de cacao en los países.	Realización de investigación	14	69	Informe por país de los perfiles identificados	si	Se consolida el consorcio con los facilitadores, se identifican nuevos potenciales participantes para futuros proyectos
1.1.1.2. Reunión inicial en Costa Rica del proyecto con el equipo de facilitadores de los tres países para validar el plan de capacitación	Vinculación	14	69	Informe de viajes de cada uno de los participantes, además del informe con el plan de capacitación validado.	no	La actividad tuvo propósito solamente para ese momento
1.1.1.3 Validación de los módulos (material didáctico, modalidad, metodología) a impartir por parte de los facilitadores en los tres países.	Manuales, textos, material didáctico	14	69	Material didáctico diseñado en formato de acceso libre con los contenidos de los módulos de capacitación	si	La validación del plan de capacitación, se debe mantener para próximos proyectos

## FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNIÓN EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

### INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

1.1.1.4 Convocatoria y comunicación con participantes del plan de capacitación.	Material para divulgación	69	207	Afiche virtual, comunicado principalmente por whatsapp a los participantes beneficiarios	no	La actividad tuvo propósito solamente para ese momento
1.1.1.5. Ejecución del plan de capacitación en cada uno de los países, dirigido a actores involucrados en las respectivas cadenas de valor de cacao.	Fortalecimiento de capacidades de la COMUNITARIAS	69	207	Informe de cada una de las capacitaciones impartidas	si	Se elaboró material didáctico e implementó una metodología que podrá ser utilizada en otras futuras capacitaciones
1.1.1.6. Retroalimentación de la capacitación, autoevaluación, coevaluación.	Rendición de cuentas	20	69	Informe de viajes de las personas participantes en el retroalimentación, así como el informe de los resultados de la evaluación realizada.	si	El informe de la evaluación del plan de capacitación permitirá hacer mejoras para próximas capacitaciones.
1.1.1.7 Participación en Salón del Cacao Centroamérica	Vinculación	3	69	Informe de viajes de los participantes al Salón de cacao y chocolate en Guatemala	si	Durante esta actividad se establecieron relaciones comerciales que se mantienen
2.1.1.1. Identificación de los términos de referencia de los profesionales a contratar para la asistencia técnica en la implementación del plan de desarrollo en los modelos de negocios, según las características propias de las respectivas cadenas de valor de cacao en los países.	Realización de investigación	14	69	Contratos de las personas consultoras: CON-24-436, CON-2024-437, CON-2024-518, CON-2024-519	no	La actividad tuvo propósito solamente para ese momento
2.1.1.2. Webinar de modelos de negocios sostenibles en el marco de la cadena de valor de cacao.	Fortalecimiento de capacidades de la COMUNITARIAS	14	69	Actividad pendiente, se realizará un informe que contendrá los insumos para	si	Actividad pendiente en donde se pretende establecer los pasos a

## FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNIÓN EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

### INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

				una posible propuesta en nuevas convocatorias.		seguir para presentar una nueva propuesta.
2.1.1.3. Identificación y selección de modelos de negocios sostenibles en la cadena de valor de cacao de cada uno de los países	Realización de investigación	14	69	Informes consultores, donde se identifican las empresas seleccionadas. Primer producto de los contratos de las personas consultoras (CON-24-436, CON-2024-437, CON-2024-518, CON-2024-519)	no	La actividad tuvo propósito solamente para ese momento
2.1.1.4. Caracterización de los modelos de negocios sostenibles identificados, basados en el modelo de Business Model Thinking	Realización de investigación	14	69	Informes consultores, donde se caracterizan las empresas seleccionadas. Segundo producto de los contratos de las personas consultoras (CON-24-436, CON-2024-437, CON-2024-518, CON-2024-519)	si	La metodología permitirá implementar y replicar la actividad a otros grupos beneficiarios.
2.1.1.5. Formulación conjunta de una propuesta de plan de desarrollo dentro de la cadena de valor de cacao, para los modelos de negocio sostenible identificados, bajo un enfoque de Life Cycle Thinking	Realización de investigación	14	69	Informes consultores, donde se formulan las propuestas de modelo de negocio de las empresas seleccionadas. Tercer producto de los contratos de las personas consultoras (CON-24-436, CON-2024-437, CON-2024-518, CON-2024-519)	si	Los socios de cada país tienen una vinculación con las empresas seleccionadas, de tal manera que hay un interés de darles seguimiento.
2.1.1.6. Plan de divulgación y comunicación de los resultados del proyecto	Difusión de resultados	14	69	Archivos de video: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1umEBQbTULfrVNct6UwVThIF4vQitxaay">https://drive.google.com/drive/folders/1umEBQbTULfrVNct6UwVThIF4vQitxaay</a>	si	El material se seguirá comunicando desde la página web del proyecto.
2.1.1.7. Realización de informe técnico y financiero del proyecto	Rendición de cuentas	14	69	Informe final de proyecto	si	Por parte del Fondo Triangular, se dará seguimiento a los resultados presentados



GOBIERNO  
DE COSTA RICA



## FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNION EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

### INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

2.1.1.8 Participación con los socios Europeos en Italia y Francia	Vinculación	1	69	Informe de viaje de la persona participante	si	Se consolida el consorcio con los socios europeos para futuras convocatorias.
---	-------------	---	----	---	----	---



## FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNION EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

### INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

2.1.1 PROCESO DE APRENDIZAJE	
<b>Desafíos más importantes</b> enfrentados en la ejecución del proyecto	<b>Soluciones encontradas</b> Para esos desafíos en la ejecución del proyecto (Técnico, administrativo, financiero, de gestión del conocimiento, de la participación de la triangulación)
<b>Estructura de gobernanza:</b> La estructura de gobernanza del Fondo como tal pareció grande y algo rígida, lo cual sumado a los procesos internos de SIAP hizo que cualquier trámite, por pequeño que fuera, involucrada hasta cinco personas en el proceso.	Conforme se hacían más trámites, se iba mejorando la experiencia, pero la cadena de la estructura de gobernanza seguía siendo la misma, si al final de la cadena se identificaba un error, por más pequeño que fuera, se devolvía el proceso al inicio. En realidad no hubo soluciones encontradas, uno de los últimos trámites tardó 8 semanas para ejecutar el pago a un proveedor de venta de alimentación.
<b>Período de ejecución:</b> Inicialmente el proyecto empezaba en noviembre 2023, luego nos indicaron que en febrero 2024, finalmente el proyecto inició actividades en abril 2024. Se aprobó una ampliación de 4 meses, periodo corto considerando los atrasos y los calendarios organizaciones (fin de año, actividades productivas de los beneficiarios, eventos climáticos, entre otros). Tomando en cuenta que había periodos de vacaciones a medio periodo y principio y fin de año en Europa y en Costa Rica, esto implicó casi dos meses sin ejecución.	Adaptarse a las condiciones, reprogramar actividades, intensificar acciones.
<b>Cambios de horario:</b> El cambio de horario con respecto a Europa dificultaba la agenda de actividades con el socio europeo, además fue complicado la participación presencial de estos socios por temas como presupuesto y distanciamiento que limitaba la participación.	Realizar reuniones virtuales en horas de la mañana, para contar con la participación de los socios europeos, abrir espacios virtuales en las actividades presenciales para contar con la participación virtual de los socios europeos.
<b>Procesos virtuales con los beneficiarios:</b> Como equipo nos propusimos implementar actividades, procesos de capacitación virtuales con los grupos beneficiarios, para fortalecer sus capacidades digitales también. Sin embargo, el para efectos de replicabilidad hay que asegurarse el acceso a internet en todas las partes. hubo poca participación, poco interés .	Se realizaron las actividades virtuales programadas, para fomentar la alfabetización digital, sin embargo, no fue posible replicarlas y se enfatizó en las actividades presenciales.

2.1.2. Lecciones aprendidas que desee destacar
La virtualidad no sustituye la presencialidad, pero puede ampliar o permanecer.
Se requiere la participación presencial de los socios europeos.
Se debe de descartar los períodos de vacaciones (dos meses ) de la ejecución de actividades



GOBIERNO  
DE COSTA RICA



Adelante2  
COOPERACIÓN TRIANGULAR UE-ALC  
FACILIDAD COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA



## FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNION EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

### INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

Estos proyectos consolidan las relaciones entre los socios del consorcio



## FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNION EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

### INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

#### 2.2 COMUNICACIÓN: medidas de visibilidad, difusión y otros

Tipo	Cantidad	Enlaces o Anexos
Estrategia de comunicación para el proyecto elaborada:	sí	Pendiente publicación de página web
¿Cuántas noticias publicadas?	Sí	<p><a href="https://www.tec.ac.cr/nuestros-proyectos-destacan-impactan-nivel-internacional">https://www.tec.ac.cr/nuestros-proyectos-destacan-impactan-nivel-internacional</a></p> <p><a href="#">Proyectos de cacao y turismo inteligente fueron escogidos por Cooperación Triangular con la Unión Europea   Hoy en el TEC</a></p> <p><a href="https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Ny8F8PTw22F9bR4tWaHC4zkwJD87oYecin6gCkDTe7SxDGfhnkXsngtmuwGz8wAWI&amp;id=100064798713987&amp;mibextid=2JQ9oc">https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Ny8F8PTw22F9bR4tWaHC4zkwJD87oYecin6gCkDTe7SxDGfhnkXsngtmuwGz8wAWI&amp;id=100064798713987&amp;mibextid=2JQ9oc</a></p> <p><a href="https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2025/03/04/60-personas-productoras-cacao-se-capacitan-economia-circular-costa-rica-honduras">https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2025/03/04/60-personas-productoras-cacao-se-capacitan-economia-circular-costa-rica-honduras</a></p>
¿Cuántos artículos con rigurosidad científica publicados?	No	En proceso de redacción para posible publicación en revista científica.0oo0
¿Cuántos productos como VÍDEOS, PODCAST, GIF, infografías?	Sí	<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1verWBYT1VqvVu4vxlvpmeuVMCOLXY9lg/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1verWBYT1VqvVu4vxlvpmeuVMCOLXY9lg/view?usp=drive_link</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/19VZu7l69walkyBzw4fbRE3-mVTb7DSVI/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/19VZu7l69walkyBzw4fbRE3-mVTb7DSVI/view?usp=drive_link</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1FI_RC1-svXkgtA1ErkbaEesYl3LVAle/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1FI_RC1-svXkgtA1ErkbaEesYl3LVAle/view?usp=drive_link</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1srh8GwBoDKWCHYO1e19X8RKBafywAkF0/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1srh8GwBoDKWCHYO1e19X8RKBafywAkF0/view?usp=drive_link</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1u-WyoFGjvBamW5Hul4upNJ9NNitKjOrj/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1u-WyoFGjvBamW5Hul4upNJ9NNitKjOrj/view?usp=drive_link</a></p>



## FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNION EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

### INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

2.3. SOSTENIBILIDAD				
¿Qué elemento del proyecto será transferido, mantenido y sostenido?	¿Cómo se hizo la transferencia para la sostenibilidad?	QUIÉN LIDERA ESTA ACTIVIDAD País coordinador, socio 1, socio 2)	Datos de contacto	¿Cómo se hará el seguimiento?
Curso de capacitación en Biocircularidad	Material didáctico de uso libre en el repositorio de la biblioteca del TEC	Costa Rica	Ricardo Salazar Díaz, <a href="mailto:risalazar@itcr.ac.cr">risalazar@itcr.ac.cr</a>	El TEC resguarda el material desde la base de datos de la biblioteca
Seguimiento a las organizaciones beneficiarias	Con base el plan de acción entregado a las organizaciones beneficiarias.	Costa Rica Honduras Nicaragua	Ricardo Salazar Díaz, <a href="mailto:risalazar@itcr.ac.cr">risalazar@itcr.ac.cr</a> Anibal Ayala Ayala <a href="mailto:cacaohonduras@fenaprocacaho.org">cacaohonduras@fenaprocacaho.org</a> Mario Nolasco <a href="mailto:lifecommodities@gmail.com">lifecommodities@gmail.com</a>	Talleres de seguimiento entre los socios del consorcio.



## FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNION EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

### INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

### 3. CONTRAPARTIDA

#### CONTRAPARTIDA INSTITUCIÓN LIDER (TEC)

#### Recordar anexar la certificación

3.1. El equipo técnico responsable de las actividades sustantivas deberá existir un responsable o punto focal por cada institución participante como mínimo.	3.2. La persona responsable de la gestión administrativo-financiera y de gestión del conocimiento responsable en medida principal de ejecución de recursos y procesos.	3.3. Transporte terrestre en el país donde se ejecuten actividades cuando se realizan visitas especiales.	3.4. Espacio físico, equipamiento y cualquier otro activo que se emplee.	3.5. Materiales e insumos.	3.6 Otro
MONTO <b>€ 12 966,46</b>	MONTO <b>€ 23 274,86</b>	MONTO <b>€ 3 333,33</b>	MONTO <b>€ 217,20</b>	MONTO <b>€ 1 084,00</b>	MONTO <b>€ 410,66</b>
1 experto ejecuta una o varias de las 15 actividades contempladas en el proyecto.  Todas las actividades se ejecutan en un total de 68 días. Cada día se paga a € 106.24  Se suman 3 días de preparación a cada una de las actividades que duran menos de 15 días; y 5 días de preparación a las actividades que duran más de 15 días.  Se suman € 138,5 a cada una de las actividades por trayectoria académica (TA) del experto junior que la ejecuta.	1 responsable (coordinador) por 12 meses a medio tiempo, a € 2428,39 por mes.  Se suman € 230,9 de TA por cada mes de ejecución del proyecto, del responsable senior.	Para el traslado del equipo facilitador para las actividades del proyecto en la Región Huetar Norte, utilizando vehículos institucionales, el monto corresponde al costo de € 1.2 por kilómetro.	Alquiler de espacio para talleres de capacitación en Costa Rica  Se calcula como un porcentaje del 5% de costos indirectos.	Material especializado para las actividades, talleres y reuniones virtuales de modelos de negocios sostenibles  Se calcula como un porcentaje del 5% de costos indirectos.	Telecomunicaciones de las siguientes actividades:  1.1.1.2. Reunión inicial en Costa Rica para validar el plan de capacitación. 1.1.1.5. Ejecución del plan de capacitación en cada uno de los países. 2.1.1.2. Webinar de modelos de negocios sostenibles. 2.1.1.7. Realización de informe técnico y financiero del proyecto.  Se calcula como un porcentaje del 5% de costos indirectos.



## FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNION EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

### INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

#### CONTRAPARTIDA INSTITUCIÓN SOCIA 1 (FENAPROCAHAO)

#### Recordar anexar la certificación

3.1. El equipo técnico responsable de las actividades sustantivas deberá existir un responsable o punto focal por cada institución participante como mínimo.	3.2. La persona responsable de la gestión administrativo-financiera y de gestión del conocimiento responsable en medida principal de ejecución de recursos y procesos.	3.3. Transporte terrestre en el país donde se ejecuten actividades cuando se realizan visitas especiales.	3.4. Espacio físico, equipamiento y cualquier otro activo que se emplee.	3.5. Materiales e insumos.	3.6 Otro
€1200	€470	€1100	€667	€ 567	€0
Este monto es calculado 1/4 del tiempo de un profesional participante del proyecto, al mes según ley trabajamos 160 horas de las cuales 40 son invertidas en el proyecto Biocircular, la persona responsable de coordinar a lo interno y externo de la organización para asegurarse la ejecución de los fondos y las actividades.	Este monto es calculado 1/8 de su tiempo al proyecto, al mes según ley trabajamos 160 horas de las cuales 20 son invertidas en el proyecto Biocircular, la persona responsable de la parte administrativa, lleva todo el proceso de los fondos para invertir en la actividad a realizar, así mismo hacer la respectiva liquidación	Este monto es calculado según el costo total del proyecto, el cual es de 69,000 euros de los cuales el 5% es contrapartida que equivale a 3,450 euros de los cuales 1600 son asignados a transporte, FENAPROCAHAO se mueve en los carros instituciones por lo que no solo es en base a combustible si no en base a mantenimiento y depreciación, se tomo en cuenta las distancias, cambios de aceite, mantenimiento del vehículo	Este monto es calculado según el costo total del proyecto, el cual es de 69,000 euros de los cuales el 5% es contrapartida durante el período reportado. Asignados para espacio físico, equipo etc, aquí calculamos según alquiler de salón, tomando ejemplo en eventos donde se alquila el salón, este ha tenido un costo 25 £ por hora haciendo un total de 200 £ por actividad y esto multiplicado por 5 actividades equivale al monto (es necesario aclarar que esto incluye, energía eléctrica, alquiler desalón, internet, agua y equipo tecnológico)	según el costo total del proyecto, el cual es de 69,000 euros de los cuales el 5% es contrapartida durante el período reportado. Asignados para materiales e insumos, aquí FENAPROCAHAO invierte en materiales didácticos que pueden ayudar a facilitar el aprendizaje, según precios de proveedores se calculo para los talleres realizados y a realizar y se invierte 170 £ por actividad esto incluye: papel, lápices, marcadores, cartulinas, papelógrafos, tarjetas metaplan, impresiones, tinta etc	



## FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNION EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

### INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

#### CONTRAPARTIDA INSTITUCIÓN SOCIA 2 (Madre Cacao)

##### Recordar anexar la certificación

3.1. El equipo técnico responsable de las actividades sustantivas deberá existir un responsable o punto focal por cada institución participante como mínimo.	3.2. La persona responsable de la gestión administrativo-financiera y de gestión del conocimiento responsable en medida principal de ejecución de recursos y procesos.	3.3. Transporte terrestre en el país donde se ejecuten actividades cuando se realizan visitas especiales.	3.4. Espacio físico, equipamiento y cualquier otro activo que se emplee.	3.5. Materiales e insumos.	3.6 Otro
\$1820	\$165	\$1290	\$900	\$990	\$632
<p>Actividad 1.1.1.2 36 horas profesionales del coordinador del proyecto</p> <p>Actividad 1.1.1.3 26 horas profesionales de diseñador gráfico y diagramador</p> <p>Actividad 1.1.1.4 2 horas profesionales del coordinador del proyecto</p> <p>Actividad 1.1.1.5 36 horas profesionales del coordinador del proyecto</p> <p>Actividad 2.1.1.2. 4 horas coordinador del proyecto para el tercer y cuarto módulo de capacitación</p>	<p>Actividad 1.1.1.1. 2 horas profesionales del administrador financiero</p> <p>Actividad 2.1.1.1. 8 horas profesionales del administrador financiero</p>	<p>Actividad 1.1.1.2 32 horas profesionales del coordinador del proyecto</p> <p>Actividad 1.1.1.3 22 horas profesionales de diseñador gráfico y diagramador</p> <p>Actividad 1.1.1.4 2 horas profesionales del coordinador del proyecto</p> <p>Actividad 1.1.1.5 32 horas profesionales del coordinador del proyecto</p> <p>Actividad 2.1.1.2. 4 horas coordinador del proyecto para el tercer y cuarto módulo de capacitación</p>	<p>Actividad 1.1.1.1. 6 horas profesionales del administrador financiero</p> <p>Actividad 2.1.1.1. 8 horas profesionales del administrador financiero</p>	<p>Actividad 1.1.1.2 28 horas profesionales del coordinador del proyecto</p> <p>Actividad 1.1.1.3 20 horas profesionales de diseñador gráfico y diagramador</p> <p>Actividad 1.1.1.4 2 horas profesionales del coordinador del proyecto</p> <p>Actividad 1.1.1.5 28 horas profesionales del coordinador del proyecto</p> <p>Actividad 2.1.1.2. 2 horas coordinador del proyecto para el tercer y cuarto módulo de capacitación</p>	<p>Actividad 1.1.1.1. 4 horas profesionales del administrador financiero</p> <p>Actividad 2.1.1.1. 8 horas profesionales del administrador financiero</p>

#### CONTRAPARTIDA INSTITUCIÓN SOCIA 3 (UNIBO)

##### Recordar anexar la certificación

3.1. El equipo técnico responsable de las actividades sustantivas deberá existir un responsable o punto focal por cada institución participante como mínimo.	3.2. La persona responsable de la gestión administrativo-financiera y de gestión del conocimiento responsable en medida principal de ejecución de recursos y procesos.	3.3. Transporte terrestre en el país donde se ejecuten actividades cuando se realizan visitas especiales.	3.4. Espacio físico, equipamiento y cualquier otro activo que se emplee.	3.5. Materiales e insumos.	3.6 Otro
MONTO €0	MONTO €0	MONTO €0	MONTO €0	MONTO € 0	MONTO €0
-	El monto es equivalente a 3800€ se calcula con base al equivalente en horas dedicadas al proyecto con base al salario bruto anual para el Profesor y para un	-	-	-	-



## FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNION EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

### INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

	estudiante de doctorado. Sin embargo, se reporta con 0€ por motivos administrativos de UNIBO				
--	--	--	--	--	--

#### 4. ANEXOS

##### Numeros los anexos

- **IMÁGENES DEBIDAMENTE IDENTIFICADA (sitio, fecha, autoría) máximo 2 por evento.**
- **Anexe**
  - **Actas de reuniones**
  - **Material técnico elaborado.**
  - **Listados de eventos**
  - **Otro material no mencionado**

<https://teams.microsoft.com/l/channel/19:CCrjHOASqQeOLWy2-MmhWXuT7HK0gFi1POt4Du1j7yY1@thread.tacv2/General?groupId=b11ca06b-9da1-431f-91c6-644bb64e0813&tenantId=1119bb90-88ba-4894-b7f1-de26e129d977>



GOBIERNO DE COSTA RICA



## FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNION EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

### INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

BA **General** Publicaciones Archivos +

+ Nuevo ↑ Cargar Editar en vista de cuadrícula ... ☰ Todos los

Documentos > General > **doc proyecto y administrativo (reuniones, lanzamiento)**

Nombre	Modificado	Modificado por
<u>formato documentos pro...</u>	3 de julio	Laura Brenes Peralta
Lanzamiento 2024	10 de febrero	Laura Brenes Peralta
reunión Consorcio 2024_feb_1 y 2_en Cost...	3 de julio	Laura Brenes Peralta
reunión Consorcio 2024_jul o sep en Hond...	3 de julio	Laura Brenes Peralta
reunión mensual 2024_feb_21	3 de julio	Laura Brenes Peralta
reunión mensual 2024_abr_11	3 de julio	Laura Brenes Peralta
reunión mensual 2024_jul_19	19 de julio	Laura Brenes Peralta
reunión mensual 2024_jun_6	3 de julio	Laura Brenes Peralta
reunión mensual 2024_mar_19	3 de julio	Laura Brenes Peralta
reunión planeamiento 2023	10 de febrero	Laura Brenes Peralta



GOBIERNO DE COSTA RICA



# FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNION EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

## INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

BA **General** Publicaciones Archivos +

+ Nuevo Cargar Editar en vista de cuadrícula Todos los documentos

Documentos > General > OBJETIVO 1 > **Materiales Reunión 1 y 2 Feb 2024\_CostaRica**

Nombre	Modificado	Modificado por	+ Agregar columna
evidencia fotográfica	10 de febrero	Laura Brenes Peralta	
Agenda 1 y 2 de febrero.docx	1 de febrero	Laura Brenes Peralta	
Contenido de módulos para trabajo en reu...	10 de febrero	Laura Brenes Peralta	
Mesas de trabajo.docx	31 de enero	Laura Brenes Peralta	
MINUTA REUNIÓN 1 y 2 de febrero 1.docx	10 de febrero	Laura Brenes Peralta	
Propuesta módulos versión inicial.docx	10 de febrero	Laura Brenes Peralta	
Reporte de Asistencia Proyecto Biocircular...	10 de febrero	Laura Brenes Peralta	

00:07 9/8/2024



GOBIERNO DE COSTA RICA



# FONDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR UNION EUROPEA – COSTA RICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EN EL MARCO DE ADELANTE 2

## INORME DE CIERRE DE PROYECTOS

The screenshot shows a Microsoft Teams chat window for a channel named 'BA'. The chat content is a document list titled 'Módulos Costa Rica'. The list includes the following items:

Nombre	Modificado	Modificado por
Documentos Adm Módulo Capacitación CR	26 de febrero	Laura Brenes Peralta
Modulo 1 (Cont 1.1, 1.2, 1.3)	16 de abril	Laura Brenes Peralta
Modulo 2 (Cont 2.1, 2.2, 2.3)	16 de abril	Laura Brenes Peralta
Modulo 3 (Cont 3.1, 3.2, + costos)	19 de julio	Laura Brenes Peralta
Modulo 4 (Cont. 4.1, 4.2)	19 de julio	Laura Brenes Peralta
Modulo 5	9 de julio	Marcela Fernandez Ro
OLD	27 de febrero	Anna Niero
Contenido de módulos versión final.docx	4 de marzo	Laura Brenes Peralta
